


ガスタービン更新の工事範囲および工事実績

【ガスタービン更新の工事範囲】

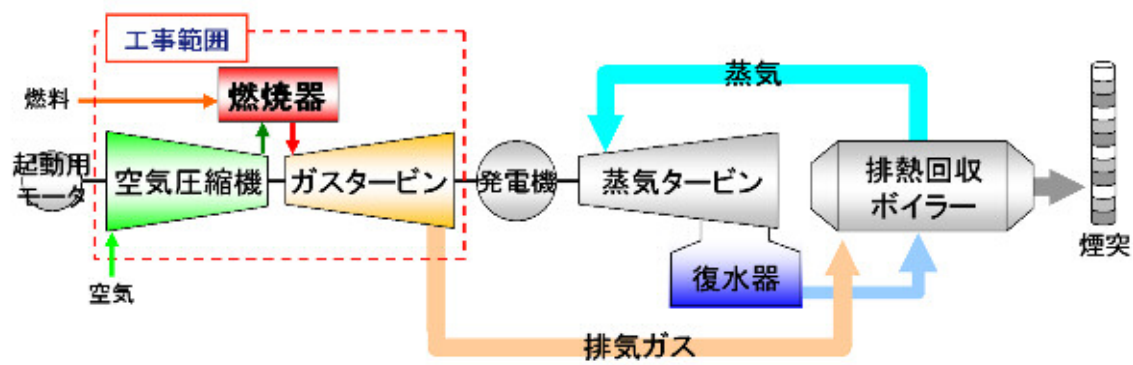

【ガスタービン更新の工事実績】

年 度	H22	H23	H24	H25	H26	H27
実績	H22/12 H23/8 ▽ 1-2号		H24/12 H25/7 ▽ 1-1号		H26/9 H27/3 ▽ 1-3号	
	H23/9 H24/3 ▽ 1-4号		H26/3 H26/9 ▽ 1-6号			
			H25/9 H26/3 ▽ 1-5号			

※ 着工時点では、平成25年6月の工事完了を予定していましたが、東日本大震災の発生に伴い、電力供給力確保のために、工事工程の一部繰延べを行いました。
