島根原子力発電所の運転実績（平成２３年度）

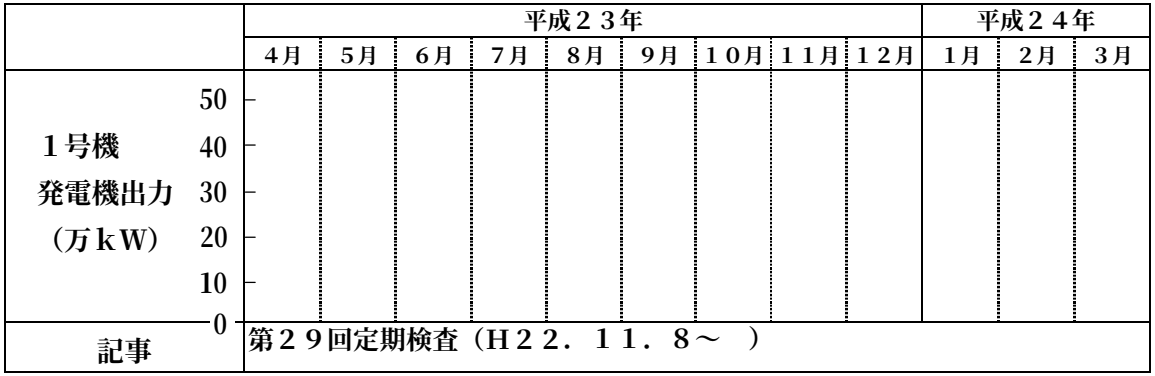

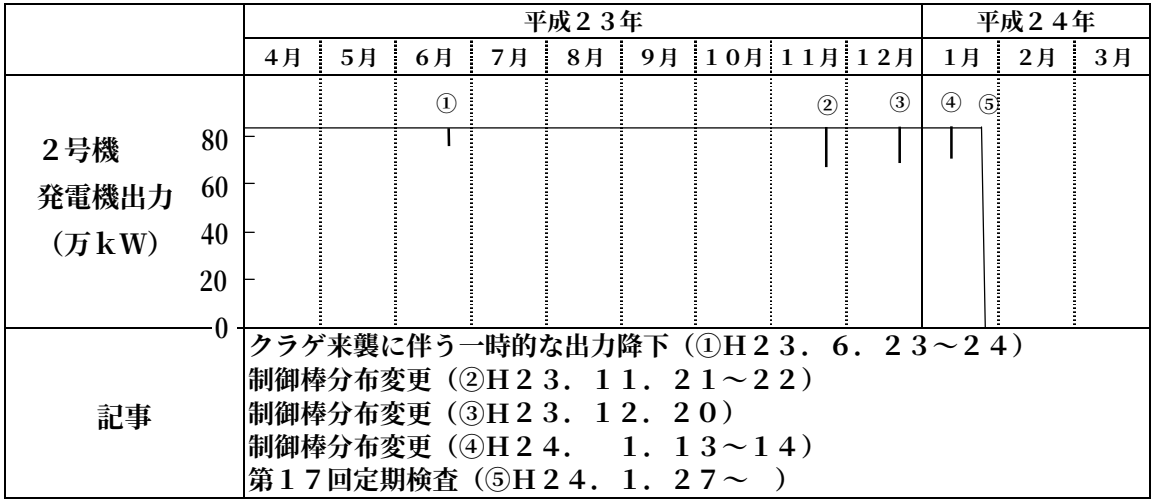

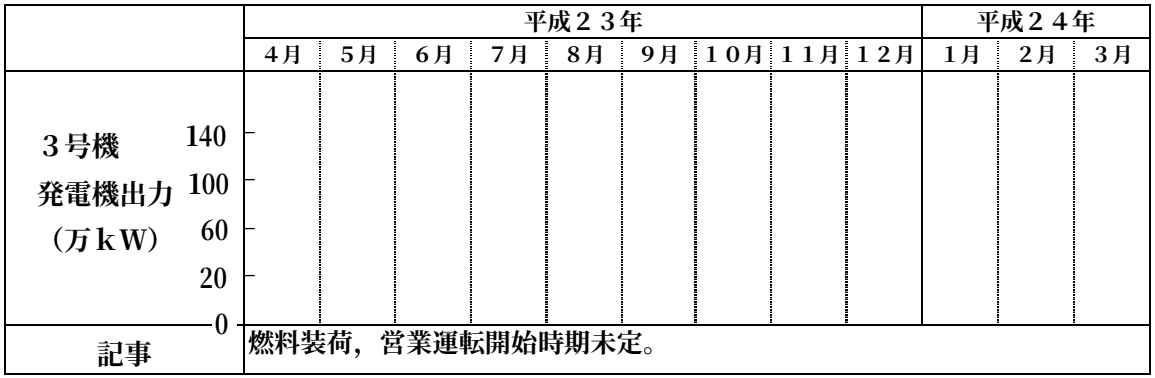

１．運転実績

項　目	単　位	１号機	２号機
発電時間	h	0:00	7,225:00
発電電力量	万kWh	0.0	591,869.0
設備利用率	%	0.0	82.2

２．放射性気体廃棄物放出管理実績

単位：Bq／年

	放射性希ガス	放射性よう素 I-131
１号機	ＮＤ※1	6.0×10^{5}※2
２号機	ＮＤ※1	1.9×10^{6}※2
放出管理目標値	8.4×10^{14}	4.3×10^{10}
サイトバンカ建物	－	6.4×10^{4}※2

※１　検出限界値未満
※２　福島第一原子力発電所における事故の影響と推定される。

３．放射性液体廃棄物放出管理実績

単位：Bq／年

	トリチウムを除く	トリチウム
１号機放水口	ＮＤ※1	5.7×10^{10}
２号機放水口	ＮＤ※1	2.8×10^{11}
放出管理目標値	7.4×10^{10}	7.4×10^{12}※2

※１　検出限界値未満
※２　年間放出管理の基準値

４．一般公衆の実効線量の評価

単位：ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ／年

項　目	線　量
実効線量の評価値※1	＜０．００１
法令で定める一般公衆の線量限度（年間）※2	1
参考：自然界から受ける線量（年間）	２．４

※１　「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」に基づいて評価した値。
※２　自然放射線などから受ける線量は除外した値。

５．定期検査

	１号機第２９回	２号機第１７回
発電停止日	平成２２年１１月　８日※	平成２４年　１月２７日
発電開始日	－	－
定期検査終了日	－	－
発電開始日までの期間	－	－
定期検査終了までの期間	－	－

※　自主的な点検のため停止（Ｈ２２．３．３１～Ｈ２２．１１．７）

様式　Ｈ－２－②
添付－１
